



Belgische Industriële Controle v.z.w.

Antwerpen : 128/136 - Mechelsesteenweg - 2018 Antwerpen.
 O-W-Vlaanderen : Legendaalreef 80 - 8020 Oostkamp.
 Brabant : Oorlogskruisenlaan 126 bus 12 - 1120 Brussel.
 Hainaut : Av. Général Michel 1E bte 115 - 6000 Charleroi.
 Limburg : Grote Baan 76 bus 1 - Houthalen - Helchteren.
 Liège : Rue Grand-Vinâve 61 - 4101 Jemeppe.

Tél. 03/247.94.00 - Fax. 03/247.94.99
 Tél. 050/84.17.85 - Fax. 050/82.38.00
 Tél. 02/245.46.95 - Fax. 02/215.12.78
 Tél. 071/30.50.32 - Fax. 071/31.67.35
 Tél. 011/60.44.20 - Fax. 011/60.44.19
 Tél. 04/234.17.00 - Fax. 04/234.17.80

Erkend Controle-Organisme

Bankrekeningen : 001-2821893-45 196-4170042-67
 240-0325513-82 340-0298168-28

B.T.W. BE 406.671.312

CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LS-INSTALLATIE

Verslag Nr. 15106011E02
 Datum van onderzoek : 15/6/2004
 Eigenaar : Dhr./Mevr. Prockers
 Adres : Kapelhof 31 8930 Hamme

Verantwoordelijk uitvoering : Agge Leo
 B.T.W. of IK nr. + plaats uitreiking : Hamme
 Energieverdelers : EF
 Adres installatie : Eden

Soort controle :

- (A) Conformiteitsonderzoek van een huishoudelijke elektrische LS installatie voor het onder spanning zetten op basis van de voorschriften van het AREI Art. 270.
 B) Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische LS installatie voor verzwaring van het aangesloten vermogen op het openbaar distributienet - KB van 01.07.1992.

Soort installatie :

(Wooneenheid) (Huishoudelijke werkeenheid) (Gemeenschappelijke delen) (Werfaansluiting) (.....).
 Voedingsspanning = 1 N 400 V/3 x 230 V/3 x 400 V/3 N 400 V. Beveiliging aansluiting 26 A
 Voedingskabel hoofdbord = 4 x 20 mm². Aantal borden = 1 Aantal eindstroombanen = 26
 Algemene lastschakelaar = 40 A 103

Metingen

Ri = 2.2 Megohm. Ra = 3 Ohm (piketten/lus). Aardingscontinuïteit = niet in orde.

Differentiëlen :

I _n (A)	I _{cc} (kA)	I _d (A)	Beveiligde kringen	I _n (A)	I _{cc} (kA)	I _d (A)	Beveiligde kringen	I _n (A)	I _{cc} (kA)	I _d (A)	Beveiligde kringen
<u>40</u>	<u>3</u>	<u>0,3</u>	<u>26</u>	<u>40</u>	<u>3</u>	<u>0,03</u>	<u>15</u>				

Beschrijving :

Kringen	Beveiligingen	Secties	Kringen	Beveiligingen	Secties	Kringen	Beveiligingen	Secties	Kringen	Beveiligingen	Secties
<u>18</u>	<u>2p120A</u>	<u>2,5</u>	<u>1</u>	<u>2p140A</u>	<u>1,5</u>						
<u>4</u>	<u>2p16A</u>	<u>1,5</u>									
<u>1</u>	<u>2p37A</u>	<u>6</u>									
<u>1</u>	<u>2p16A</u>	<u>2,5</u>	<u>Voeding</u>								
<u>1</u>	<u>2p12R</u>	<u>Reserve</u>									

INBREUKEN : (zie codes op keerzijde) geen

OPMERKINGEN : Badkamer/douche : sanitaire installatie niet gerealiseerd op dag van controle.

Hoofdequipotentiele verbindingen : niet geïnstalleerd - niet verbonden

Supplementaire equipotentiele verbindingen : niet zichtbaar - bestaat volgens verklaring van verantwoordelijke voor het werk - niet geïnstalleerd - niet verbonden.

De hoofddifferentieel werd verzegeld het 1 draads- en situatieplan werd niet voor gezien ondertekend.

BESLUIT A) : De installatie is is niet conform met de wettelijke voorschriften.

BESLUIT B) : De installatie van ná 30/09/81 is is niet conform met de wettelijke voorschriften.

De installatie van vóór 01/10/81 is is niet conform met de wettelijke voorschriften.

De werken nodig om de vastgestelde inbreuken te elimineren dienen zonder uitstel te worden uitgevoerd opdat, indien de installatie in dienst zou blijven, deze geen gevaar zou vormen voor de personen en goederen.

VOLGEND ONDERZOEK AANVRAGEN VÓÓR


Indien deze tweede controle geweigerd wordt, zal een copie van dit verslag naar de Administratie Elektrische Energie verstuurd worden

Inspecteur (naam + handtekening)

Klant (naam + handtekening)

Prockers

Agge Leo
 18/06/04

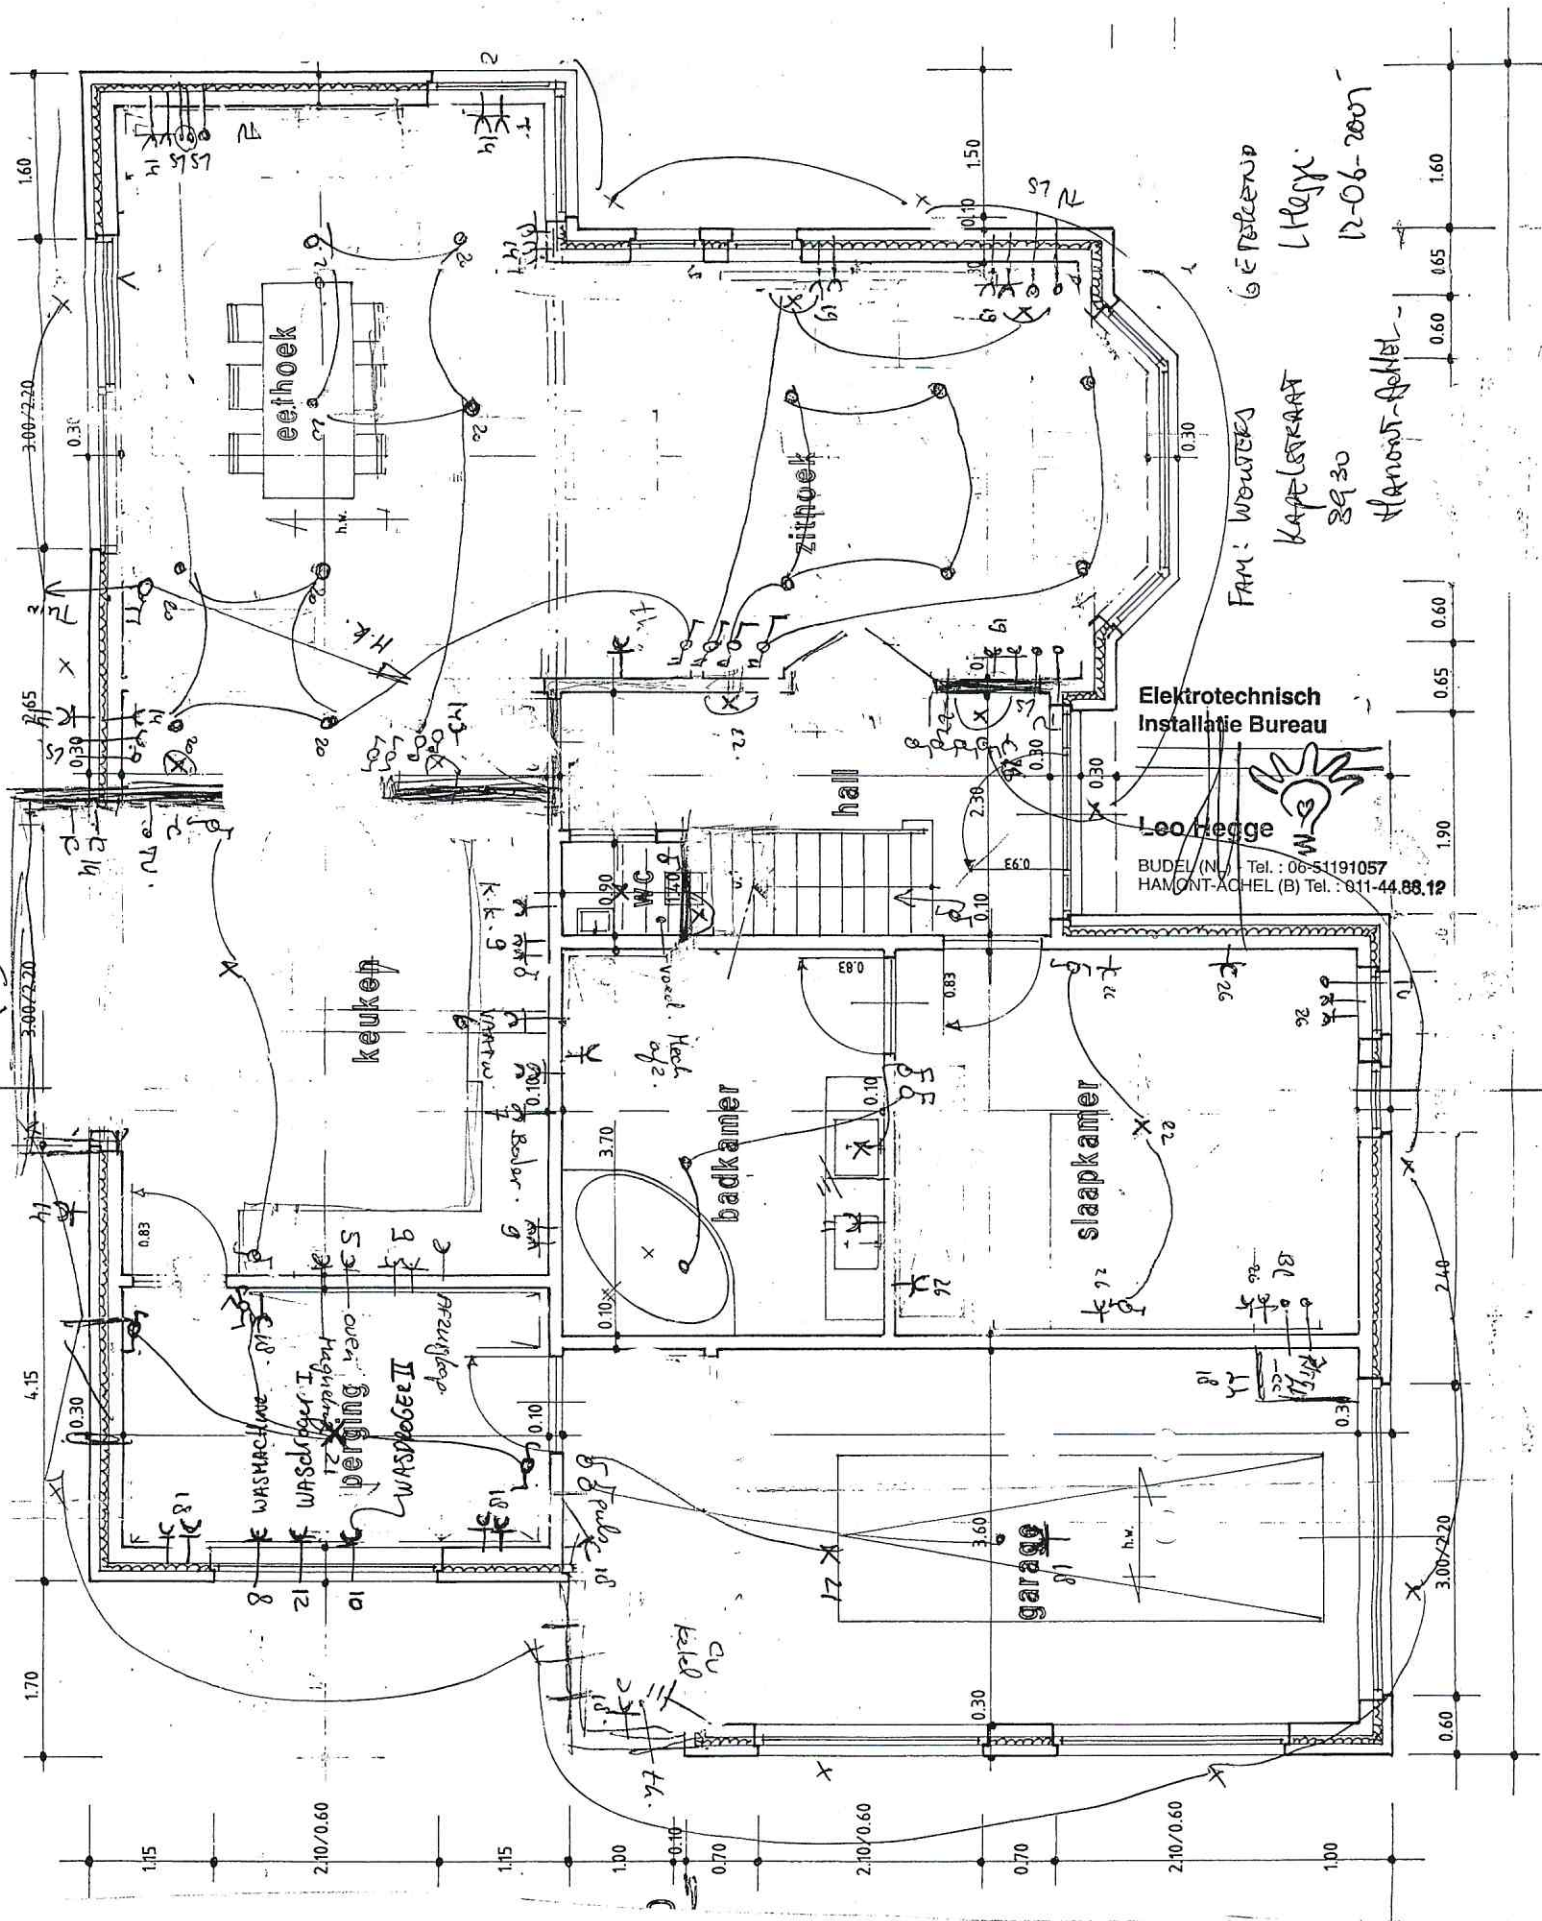

FAM: WOUWERS
 GEPELSEND
 KAPELSTRAAT
 2930
 HAMONT-Achel
 12-06-2007

Elektrotechnisch
 Installatie Bureau
 Leo Hegge
 BUDEL (N.V.) Tel.: 06-51191057
 HAMONT-ACHEL (B) Tel.: 011-44.88.12
